

Status Pelaksanaan Juli



Loan ADB 3872- INO

42

Kegiatan
On Schedule

5

Kegiatan
Behind
Schedule


2

Kegiatan
At Risk

4

Kegiatan
Completed

Dari 53 kegiatan 2 kegiatan turun ke **At Risk** (ITE-10) **ICT Smart Workshop Auditorium Gandhi** — gagal lelang; dan ITE-19 **Data Platform Enhancement** — masih proses evaluasi padahal seharusnya sudah tanda tangan kontrak). Lima kegiatan CW Smart Workshop turun ke **Behind Schedule** karena pekerjaan fisik belum selesai s.d. tanggal akhir kontrak: Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Empat kegiatan telah **Completed**: CW Sumatera Selatan, CW Sulawesi Utara, CW Bali, dan ITE-21 Collaboration Platform serta ITE-22 Software EA.

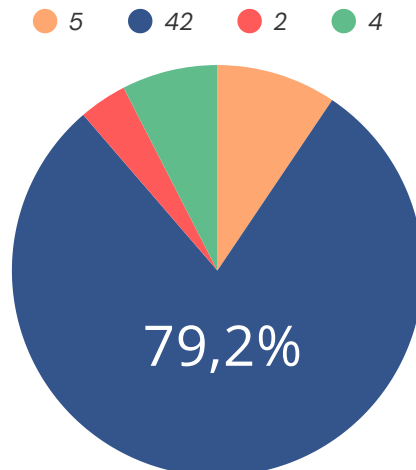

Keterangan:

- Penentuan status **On Schedule/Behind Schedule/At Risk** didasarkan pada *milestone updated* rencana pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing PIU, kecuali perwakilan yang masih menggunakan *milestone* awal.
- On Schedule**: Apabila kegiatan sesuai dengan jadwal *milestone* pada keterangan poin 1.
- Behind Schedule**: Apabila kegiatan terlambat dari jadwal *milestone* pada keterangan poin 1 namun masih bisa selesai pada tahun berjalan.
- At Risk**: Apabila kegiatan memiliki risiko tidak selesai pada tahun berjalan.

Tantangan & Rencana Tindak Lanjut STATUS ALUR KEGIATAN

PIU	Kegiatan	Perencanaan	Pengadaan	Pelaksanaan
Biro Umum	Smart Workshop Riau, Bengkulu, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara (CW)		Pelaksanaan Kontrak	Akhir Kontrak 8 Okt-2 Nov 2016
Biro Umum	Smart Workshop Auditorium Gandhi Kantor Pusat (ITE) -ITE-10 J	Gagal Tender		Target Kontrak 31 Juli 2026
Biro Umum	Smart Workshop Auditorium Gandhi Kantor Pusat (CW) - CW-5 B	Evaluasi Administrasi		Target Kontrak 31 Juli 2026
Pusinfowas	Development of BPKP IT Services and Monitoring (CW-6)		Terkontrak	Akhir Kontrak 30 Des 2026
Pusinfowas	Development of BPKP IT Services and Monitoring (ITE-23)		Terkontrak	Akhir Kontrak 30 Des 2026
Pusinfowas	Procurement of Data Platform Enhancement to Strengthen the Existing Data Lakehouse for Advanced Analytics and Data Governance (ITE-19)	Evaluasi Administrasi		Target Kontrak 14 Agustus 2026

➡ Status per Juli 2026

➡ Key milestone untuk menjaga selesai pada 2026

Financial Overview

- Kumulatif Pinjaman ADB**: US\$65.446.004,53 (72,72%) dari alokasi US\$90 juta.
- Realisasi Pagu DIPA 2026**: terealisasi 7,73% (Rp31,45 miliar) dari pagu Rp406,68 miliar. Bertambah Rp4,77 miliar (1,17%) dibanding Juni 2026.
- Disbursement vs elapsed time ratio**: 0,80 (including initial deposit) — di atas 0,3 sehingga masuk kategori *behind schedule*.
- Partial Loan Cancellation (PLC)**: Bappenas melalui surat No. T-16295/D.9/PD.04.01/07/2026 tanggal 27 Juli 2026 menyatakan usulan PLC secara prinsip dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Revisi pengurangan DIPA menunggu persetujuan final.

Tantangan Juni 2026

Dua kegiatan kontraktual berpotensi melewati tahun 2026:

- ICT Smart Workshop Aula Gandhi — Gagal lelang.
- Data Platform Enhancement (Data Lakehouse) — masih proses evaluasi, seharusnya sudah penandatanganan kontrak.

Civil Work Smart Workshop di perwakilan:

- Deviasi negatif progres fisik terhadap target *milestone* di 3 lokasi kantor perwakilan.
- Pekerjaan fisik belum selesai s.d. tanggal akhir kontrak di 5 lokasi kantor perwakilan.

Rencana Tindak Lanjut

Mendukung Koordinasi Percepatan Pengadaan

- Tim PPK Biro Umum ↔ UKPBJ — percepatan penyelesaian **proses pengadaan** ICT Smart Workshop Aula Gandhi.
- Tim PPK Pusinfowas ↔ UKPBJ — percepatan penyelesaian **proses evaluasi** (Data Platform Enhancement).
- Tujuan: penyelesaian kedua pekerjaan kontrak tidak melewati tahun 2026, termasuk **komunikasi** dengan ADB untuk mendukung percepatan tersebut.

Mendukung Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan Fisik CW Smart Workshop

- PPK Biro Umum ↔ 3 PPK Kantor Perwakilan — meminimalkan deviasi negatif pekerjaan fisik dan **mengoptimalkan peran Tenaga Pengawas** untuk memantau harian pencapaian target *milestone*, agar selesai sesuai tanggal akhir kontrak.
- PPK Biro Umum ↔ 5 PPK Kantor Perwakilan — pendekatan **pemberian kesempatan dengan denda kepada kontraktor** sesuai ketentuan kontrak, serta komunikasi dengan ADB terkait prosedur dan konsekuensi waktu atas opsi terminasi kontrak (bila terjadi).
