



Status Pelaksanaan Juni



Perubahan AWP 2026 melalui NOL ADB Nomor 008/L/STAR AF/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan kebijakan prioritas dana pinjaman menyebabkan **pembatalan kegiatan Peningkatan Konektivitas Jaringan Data Pengawasan Nasional (TIK) Paket 3**, sehingga jumlah kegiatan turun dari 54 menjadi 53. Pada Juni 2026, seluruh kegiatan berstatus **On Schedule** setelah 6 kegiatan yang sebelumnya **At Risk** masuk tahap lelang.

Kumulatif Pinjaman ADB

72,72%

US\$65,44 juta/US\$90 juta

Realisasi DIPA 2026

6,56%

Rp26,68 M/Rp406,68 M

Financial Overview


- Kumulatif Pinjaman ADB:** Telah ditarik US\$65,44 juta (72,72%) dari total alokasi US\$90 juta. Tidak berubah dari Mei 2026 karena WA No. 00107 (Rp3,64 miliar/US\$215.105) menggunakan metode likuidasi.
- Realisasi Pagu DIPA 2026:** Terealisasi 6,56% (Rp26,68 miliar) dari total Pagu Rp 406,68 miliar. Bertambah Rp 13,43 miliar (3,30%) dibandingkan Mei 2026.
- Realisasi Juni 2026:** Menyerap untuk pembayaran uang muka Developing Smart Workshop ICT Equipment Regional 3, Termin 5 Konsultan PMC, serta uang muka/termin kontrak CW Smart Workshop di 22 kantor Perwakilan BPKP.
- Faktor Rendahnya Realisasi:** Sebagian besar kegiatan kontraktual masih dalam proses pengadaan atau belum jatuh tempo pembayaran; DIPA 2026 (Rp 406,68 miliar) lebih besar dari kebutuhan AWP 2026 (Rp 299,19 miliar). Revisi pengurangan DIPA menunggu persetujuan *partial loan cancellation* ADB.

Keterangan:

- Penentuan status **On Schedule/Behind Schedule/At Risk** didasarkan pada *milestone updated* rencana pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing PIU, kecuali perwakilan yang masih menggunakan *milestone* awal.
- On Schedule:** Apabila kegiatan sesuai dengan jadwal *milestone* pada keterangan poin 1.
- Behind Schedule:** Apabila kegiatan terlambat dari jadwal *milestone* pada keterangan poin 1 namun masih bisa selesai pada tahun berjalan.
- At Risk:** Apabila kegiatan memiliki risiko tidak selesai pada tahun berjalan.

Tantangan dan Rencana Tindak Lanjut

STATUS ALUR KEGIATAN

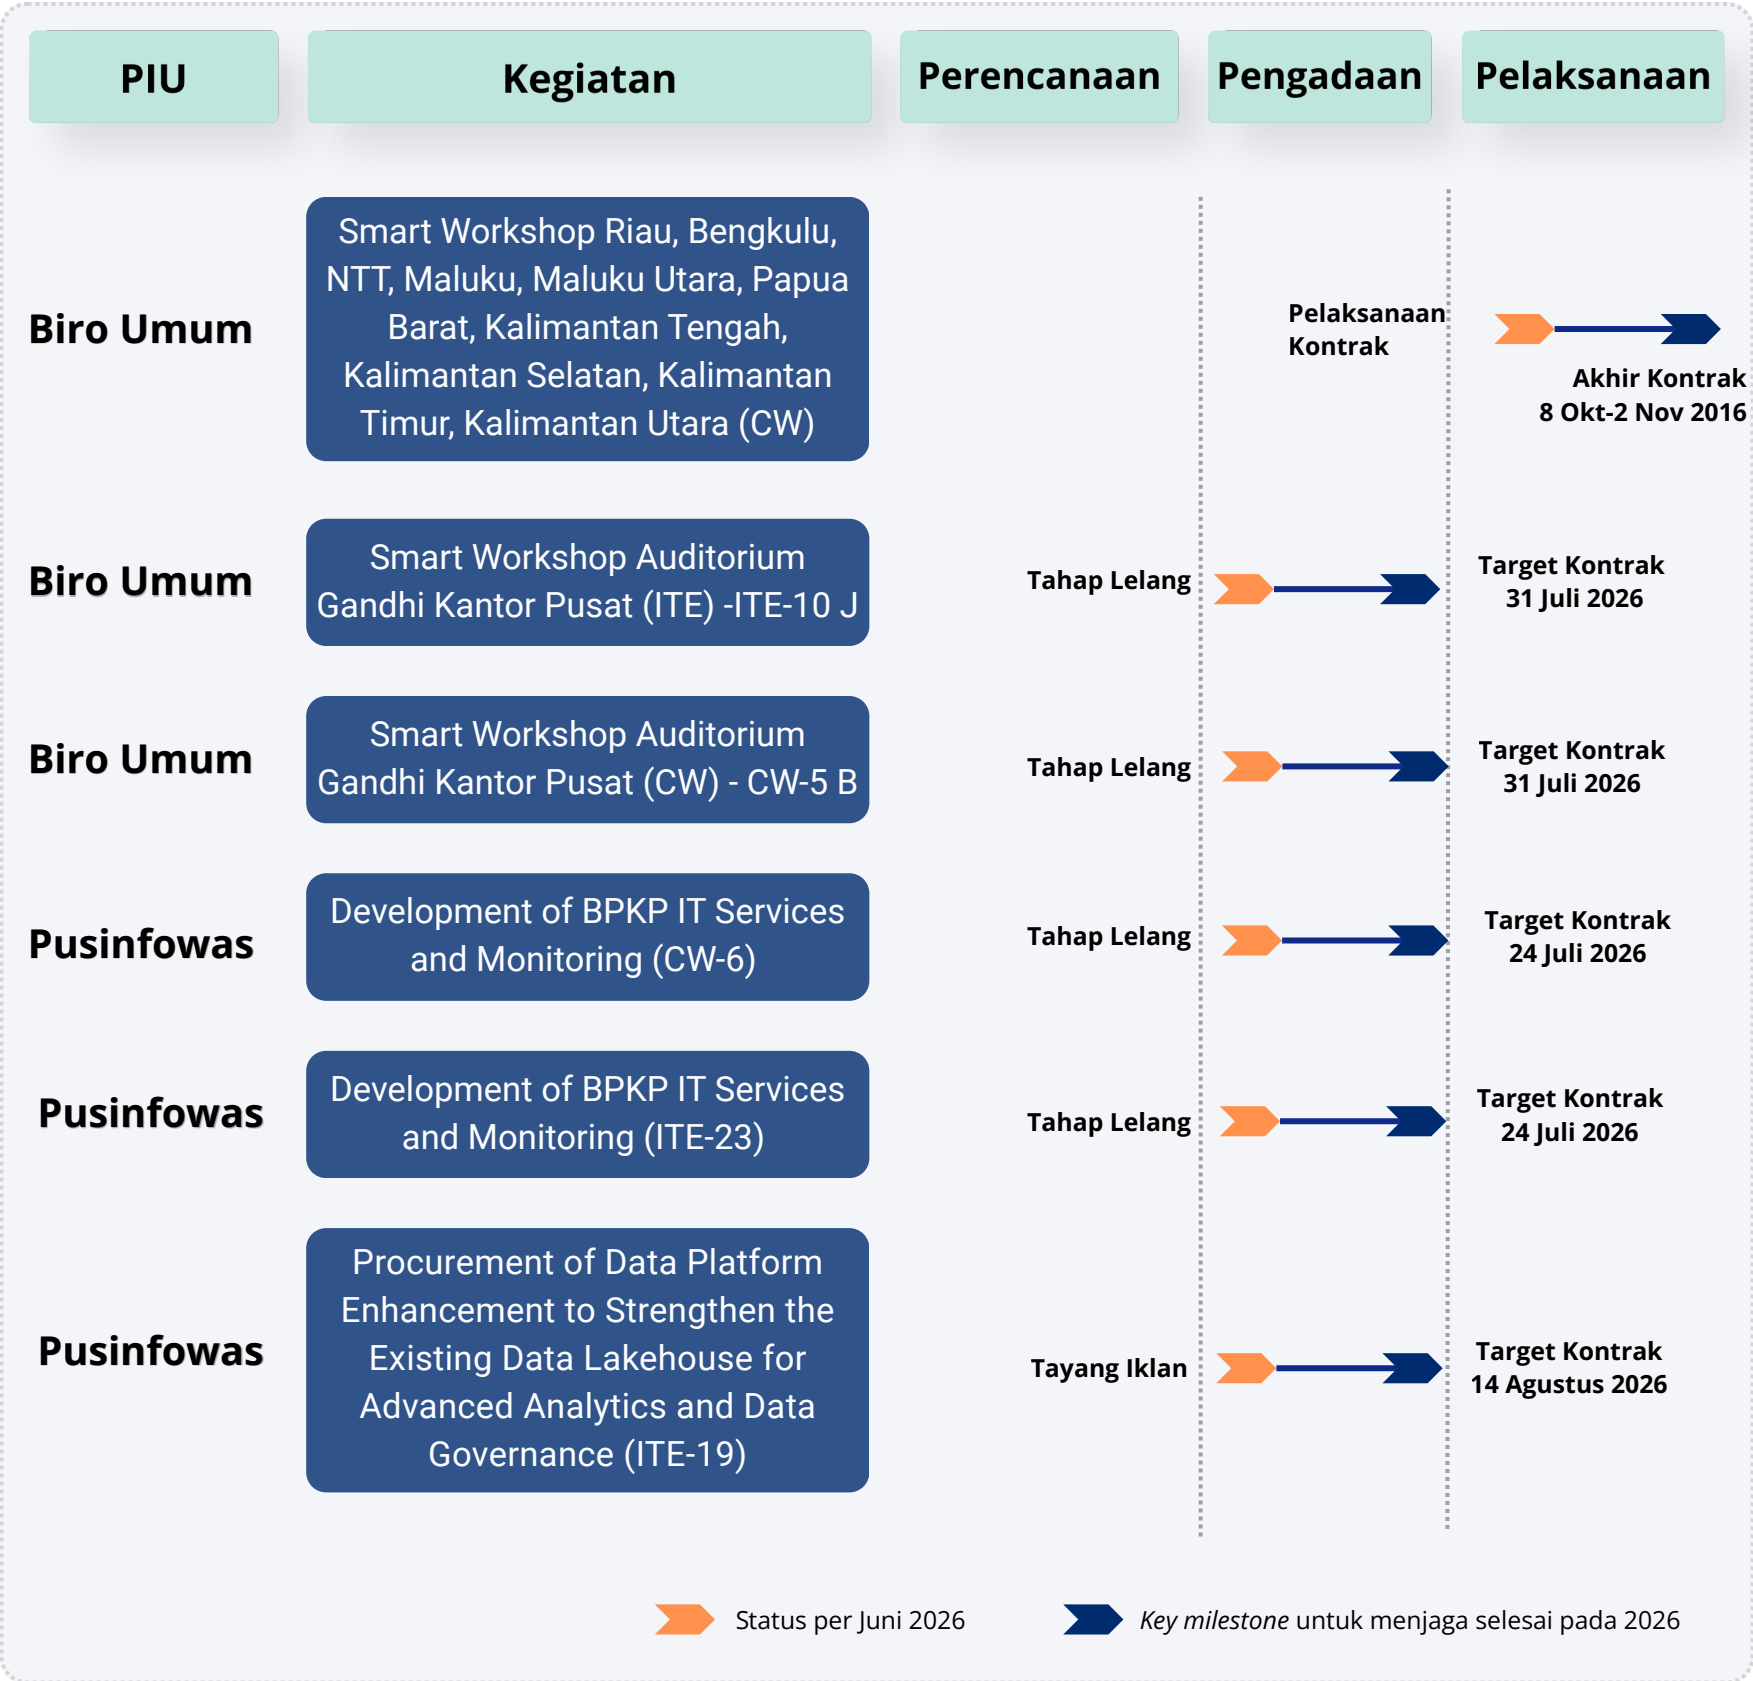

TANTANGAN JUNI 2026

- Civil Work Smart Workshop Kalbar Berisiko Terlambat:** Gap realisasi vs target fisik mencapai -53,50% (per 30 Juni 2026).
- ICT Smart Workshop Regional 1 dan 2 Tertunda:** Kontrak CW di Perwakilan Riau dan Bengkulu belum ditandatangani; kontrak ICT perlu diperpanjang.

RENCANA TINDAK LANJUT

Percepatan Koordinasi Internal

- Koordinasi PPK Perwakilan dan PPK Biro Umum** untuk penyelesaian sesuai jadwal.

Pemutakhiran Monitoring Tools

- Update target fisik CW dan ICT Smart Workshop** di 33 Perwakilan + pemetaan risiko berbasis dampak.

Koordinasi ADB untuk CCO

- Pengajuan Contract Change Order (CCO) Smart Workshop Regional 1 dan 2:** perpanjangan kontrak + penyesuaian termin.
