

Ringkasan Perkembangan Kegiatan STAR AF Agustus 2026


Status Pelaksanaan Agustus



Loan ADB 3872-INO



● 31 ● 4 ● 20

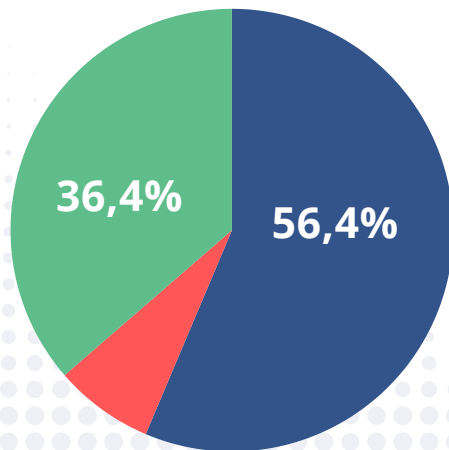

Keterangan:

- Penentuan status **On Schedule/Behind Schedule/At Risk** didasarkan pada *updated milestone* rencana pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing PIU, kecuali perwakilan yang masih menggunakan *milestone* awal.
- On Schedule:** Apabila kegiatan sesuai dengan jadwal *milestone* pada keterangan poin 1.
- Behind Schedule:** Apabila kegiatan terlambat dari jadwal *milestone* pada keterangan poin 1 namun masih bisa selesai pada tahun berjalan.
- At Risk:** Apabila kegiatan memiliki risiko tidak selesai pada tahun berjalan.

Pada Agustus 2026 dilakukan **pemecahan paket ICT SW Auditorium Gandhi** menjadi tiga paket kegiatan yang semuanya berstatus **"At Risk"** yaitu:

- Package 1 – Video Equipment:** Developing Smart Workshop: ICT Equipment for BPKP Head Office (Auditorium Gandhi) (ITE-10 J)
- Package 2 – Audio Equipment:** Developing Smart Workshop: ICT Equipment for BPKP Head Office (Auditorium Gandhi) (ITE-26)
- Package 3 – Lighting:** Developing Smart Workshop: ICT Equipment for BPKP Head Office (Auditorium Gandhi) (ITE-27).

Dengan demikian, terdapat **penambahan jumlah kegiatan** dalam laporan bulanan yang semula 53 kegiatan menjadi 55 kegiatan.

Ringkasan Keuangan

- Kumulatif Realisasi Pinjaman ADB:** US\$65,876,334.22 (84,46%) dari alokasi US\$78,001,493.32.
- Realisasi Pagu DIPA 2026:** terealisasi 11,54% (Rp46,93 miliar) dari pagu Rp406,68 miliar. Bertambah Rp31,45 miliar (7,73%) dibanding Juli 2026.
- Progress Variance (PV) = $\frac{\text{Disbursement}}{\text{Elapsed Time}}$** 0.92 (including initial deposit) — masuk kategori *behind schedule*.
- Partial Loan Cancellation (PLC):** Berdasarkan persetujuan ADB Ref. No.: 022/L/STAR AF/2026 tanggal 21 Agustus 2026 terkait Partial Loan Cancellation STAR AF, total alokasi pinjaman ADB No.3872-INO dari semula US\$90,000,000 berkurang sebesar US\$11,998,506.68 sehingga menjadi US\$78,001,493.32.

Tantangan & Rencana Tindak Lanjut STATUS ALUR KEGIATAN

PIU	Kegiatan	Perencanaan	Pengadaan	Pelaksanaan
Biro Umum	Smart Workshop Riau, Bengkulu, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara (CW)		Pelaksanaan Kontrak	Akhir Kontrak 8 Okt-2 Nov 2026
Biro Umum	Paket 1 – Video Equipment Smart Workshop Auditorium Gandhi (ITE-10 J)	Tayang Iklan		Target Kontrak 18 Sept. 2026
Biro Umum	Paket 2 – Audio Equipment Smart Workshop Auditorium Gandhi (ITE-26)	Tayang Iklan		Target Kontrak 18 Sept. 2026
Biro Umum	Paket 3 – Lighting Smart Workshop Auditorium Gandhi (ITE-27)	Tayang Iklan		Target Kontrak 18 Sept. 2026
Biro Umum	Smart Workshop Auditorium Gandhi Kantor Pusat (CW) - CW-5 B		Terkontrak	Akhir Kontrak Des 2026
Pusinfowas	Development of BPKP IT Services and Monitoring (CW-6)		Terkontrak	Akhir Kontrak 30 Des 2026
Pusinfowas	Development of BPKP IT Services and Monitoring (ITE-23)		Terkontrak	Akhir Kontrak 30 Des 2026
Pusinfowas	Procurement of Data Platform Enhancement to Strengthen the Existing Data Lakehouse for Advanced Analytics and Data Governance (ITE-19)	Persiapan ttd Kontrak		Akhir Kontrak 30 Des 2026

➡ Status per Juli 2026

➡ Key milestone untuk menjaga selesai pada 2026

Tantangan Agustus 2026

- Terdapat **4 kegiatan kontraktual** yang penyelesaiannya **berpotensi melewati tahun 2026** dengan status **At Risk** yaitu Paket 1, 2, dan 3 ICT Gandhi, dan **Data Lakehouse**.
- Kinerja capaian **realisasi penyerapan keuangan** tidak sesuai dengan kondisi terupdate total pinjaman STAR AF yang telah mengalami penyesuaian, setelah mendapatkan NOL ADB atas pembatalan sebagian pinjaman tersebut.
- Terdapat kegiatan *civil work smart workshop di perwakilan* dengan kondisi **deviasi negatif** terkait progres pekerjaan fisik yang tidak sesuai target *milestone* pekerjaan di empat perwakilan.

Rencana Tindak Lanjut

- Mendukung **koordinasi antara UKPBJ dengan tim PPK** di Biro Umum maupun Pusinfowas untuk melakukan penyesuaian *milestone* penyelesaian pekerjaan kontrak agar tidak melewati 2026;
- Mendukung koordinasi antara **Biro Keuangan, lintas PIU, dan Inspektorat** terkait usulan revisi pengurangan DIPA STAR AF.
- Mendukung koordinasi Biro Umum ↔ PPK Kantor Perwakilan untuk **meminimalkan deviasi negatif** pada pekerjaan fisik dan mengoptimalkan peran Tenaga Pengawas dalam memantau secara harian atas pencapaian target *milestone*, agar pekerjaan fisik **selesai sesuai tanggal akhir kontrak**.
